ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
1				
2	Klargjøring av tomt	9 dager	ti 11.04.23	fr 21.04.23
3	**Spunt**	**45 dager**	**ma 24.04.23**	**to 29.06.23**
4	Tilrigg spuntutstyr	1 dag	ma 24.04.23	ma 24.04.23
5	Nedramming av spunt	10 dager	ti 25.04.23	ti 09.05.23
6	Boring og montering av fotbolter	8 dager	to 04.05.23	ma 15.05.23
7	Utgraving for øvre puterad	4 dager	on 10.05.23	ma 15.05.23
8	Montering puter øvre puterad	9 dager	on 10.05.23	on 24.05.23
9	Boring av stag øvre stagrad	12 dager	ma 15.05.23	fr 02.06.23
10	Montering stag øvre stagrad del 1	1 dag	to 25.05.23	to 25.05.23
11	Montering stag øvre stagrad del 2	1 dag	to 01.06.23	to 01.06.23
12	Montering stag øvre stagrad del 3	1 dag	to 08.06.23	to 08.06.23
13	Herdetid øvre stagrad	15 dager	ma 22.05.23	ma 12.06.23
14	Oppspenning øvre stagrad del 1	1 dag	ti 30.05.23	ti 30.05.23
15	Oppspenning øvre stagrad del 2	1 dag	ti 06.06.23	ti 06.06.23
16	Oppspenning øvre stagrad del 3	1 dag	ti 13.06.23	ti 13.06.23
17	Utgraving for nedre puterad	2 dager	ti 30.05.23	on 31.05.23
18	Montering puter nedre stagrad	5 dager	to 01.06.23	on 07.06.23
19	Boring av stag nedre stagrad	7 dager	ti 06.06.23	on 14.06.23
20	Montering stag nedre stagrad del 1	1 dag	ma 12.06.23	ma 12.06.23
21	Montering stag nedre stagrad den 2	1 dag	fr 16.06.23	fr 16.06.23
22	Herdetid nedre stagrad	13 dager	ti 13.06.23	to 29.06.23
23	Oppspenning nedre stagrad del 1	1 dag	fr 16.06.23	fr 16.06.23
24	Oppspenning nedre stagrad del 2	1 dag	fr 23.06.23	fr 23.06.23
25	Utlasting av overskuddsmasser	60 dager	ma 24.04.23	to 20.07.23
26	Spreningigsarbeider	30 dager	fr 16.06.23	to 27.07.23
27	Utlasting fjell	25 dager	fr 14.07.23	to 17.08.23
28	Utvendig VA innenfor spunt	20 dager	fr 04.08.23	to 31.08.23
29	Bærelag	20 dager	fr 18.08.23	to 14.09.23
30	Utvendig VA utenfor spunt	20 dager	fr 15.09.23	to 12.10.23
31	Forankringsbolter	25 dager	fr 08.09.23	to 12.10.23
32	Betongarbeider	105 dager	fr 15.09.23	fr 16.02.24

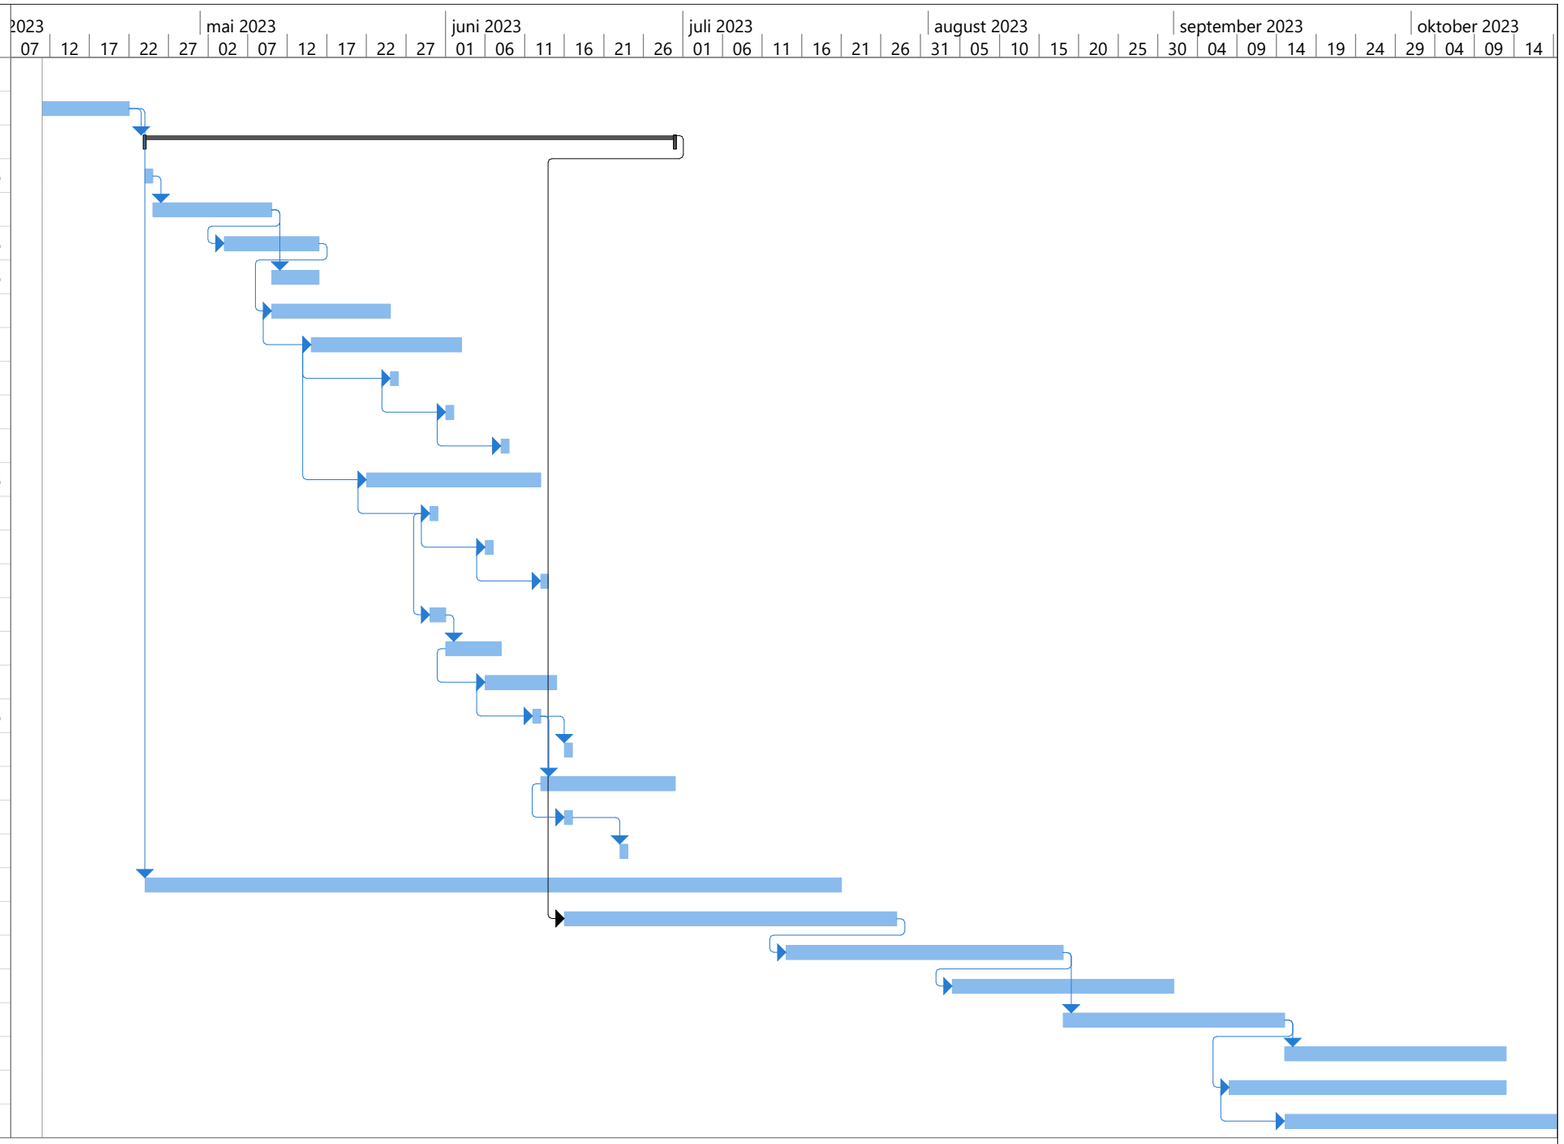

Prosjekt: Fase 1 - Gunnarbeider
Dato: on 15.03.23

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			
